


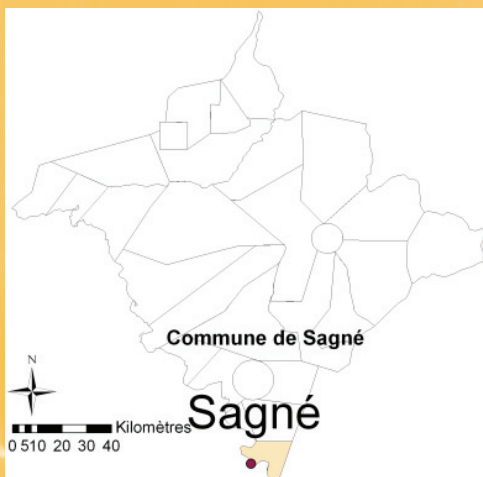

Localité : Sagné
Commune : Sagné
Moughataa de Maghama
Wilaya du Gorgol
Localisation : à environ 156 km au sud-est de Kaédi
Population : 7 500 habitants

La parole du terrain ou l'anecdote des travaux.

« En plus d'évacuer l'eau en surplus, les tuyaux ont permis aux poissons de remonter et d'être piégés dans les mares. »

Gata Ba

Agent de Développement de la Commune de Sagné

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Financements



©GRDR 2010

Constats

Les zones d'habitation de Sagné sont chroniquement inondées par les eaux de ruissellement. L'absence de système d'évacuation des eaux entraîne leur stagnation dans **4 zones** pendant plusieurs mois. Ces zones sont aussi exceptionnellement remplies par l'eau du walo ou du fleuve.

Description des travaux

- Un système souterrain d'évacuation d'eau pluviale a été installé pour évacuer les eaux stagnantes vers le fleuve ;
- 78 m de tuyaux PVC diamètre 160mm, 654 m de tuyaux 200 ont été installés pour drainer les eaux vers le fleuve ;
- Le système est muni de 2 chambrettes collectrices, de 5 avaloirs et un regard de contrôle ; chaque système est équipé de clapets anti retour et batardeaux qui permettront l'entretien du réseau et empêcheront les crues du fleuve d'inonder le village par ce réseau.

Durée des travaux : 2 mois ;

Réception : septembre 2010

Coûts des investissements directs :

4 715 700 MRO

Mobilisation villageoise : 302 hommes-jours soit l'équivalent de 463 000 MRO

Impacts attendus

- 200 foyers protégés du débordement récurrent des eaux stagnantes (environ **1200 personnes**) ;
- Diminution des risques de prolifération des germes et parasites liés à la stagnation d'eau ;
- Circulation entre les quartiers facilitée ;
- Ouvrage pilote à vocation démonstrative.



Chambre de collecte côté Fleuve
